

Imię	Nazwisko	Nr indeksu	Grupa	Pkt

**PPI** data:

--	--	--	--

1. Wyjaśnij pojęcie metodyki. Dokonaj klasyfikacji metodyk zarządzania projektami.

2. Wyjaśnij, na czym polega metoda przyjęcia ryzyka. Podaj przykład zastosowania tej metody w projekcie.

3. Wymień obszary zarządzania wyróżniane przez PMBOK, a następnie scharakteryzuj jeden z nich.


4. Zapisz w języku naturalnym algorytm wyznaczania ścieżki krytycznej z wykorzystaniem diagramów procedencji.

5. 12. W kierowanym przez Ciebie projekcie wartości współczynników metody EVM są następujące:  $EV = 7362$  PLN,  $BCWS = 8232$  PLN. Oblicz wartość  $SV$  w tym projekcie.

6. W jakim celu i dla kogo tworzy się statut projektu? Podać minimalny zestaw informacji, które powinny znaleźć się w statucie projektu (wg koncepcji prezentowanej na wykładach).

7. W pewnym projekcie zaplanowany budżet projektu wynosi 10<sup>6</sup> kPLN. W pierwszym miesiącu zaplanowano do wykonania zadania: A (50 k PLN), zadanie B (100 k PLN) oraz zadanie C (50 k PLN). Po zakończeniu pierwszego miesiąca okazało się, że wykonano tylko zadania A i B i wydano 250 k PLN. Oblicz ile wyniesie w takim wypadku szacowany rzeczywisty koszt tego projektu

8. Na rysunku przedstawiono fragment diagramu Gantta dla pewnego projektu. Na podstawie tego diagramu można obliczyć wartość wskaźnika EV w metodzie FVM w dniu 2.2.2008

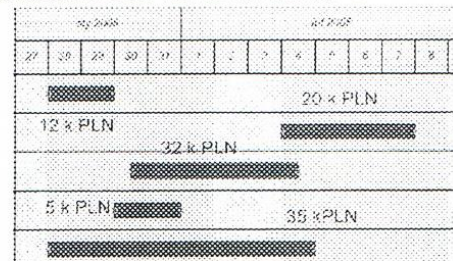

9. Dany jest kontekst projektu: Rada nadzorcza pewnego polskiego banku posiadającego znaczny wkład kapitału zagranicznego od pewnego czasu śledzi rosnącą popularność tzw. agencji finansowych. Agencje finansowe to zazwyczaj niewielkie podmioty gospodarcze przyjmujące różnego rodzaju opłaty (za czynsz, za media, za abonament radiowo-telewizyjny, czy telefoniczny) od osób fizycznych naliczające znacznie mniejsze prowizje niż urzędy pocztowe, czy banki. Szefostwo wspomnianego banku postanowiło zorganizować sieć tego rodzaju formalnie niepowiązanych kapitałowo z bankiem placówek pod własnym szyldem, by w ten sposób przyciągnąć nowych klientów – szczególnie w niewielkich miejscowościach. Twoja firma otrzymała zlecenie na realizację systemu informatycznego wspierającego: (1) składanie dyspozycji wpłat w agencjach, oraz (2) rozliczanie agencji przez bank (naliczanie i podział prowizji, przekazanie dyspozycji do ELIXIR-OK, obsługa zwrotów z ELIXIR-OK, itp.). Sformułuj definicję tego projektu i wyraż ją w formie mapy pamięci.

10. Dla problemu z pkt 9 zaproponuj diagram WBS dla poziomów 1 i 2.
